



FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

FTR-CB-PREV N° 0861-2025-ANA-AAA.U-ALA.TAR

PROPUESTA TÉCNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

1. UBICACIÓN:

AAA UCAYALI ALA TARMA Fecha 10/29/2025

1.1. Ubicación política

Departamento JUNIN Provincia TARMA Distrito TAPO Sector YAROCA

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA PERENÉ Cuerpo de agua RÍO RICRAN

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Norte (Y):	Este (X):	Zona	Norte (Y):	Este (X):	Zona		
TRAMO	8,742,455.00	440,740.00	18L	8,743,284.00	440,272.00	18L	AMBAS	MURO DE GAVIÓN

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☐ Muy Alto ☒

2.3. Geología

A nivel regional y basado en la información geológica existente, en el área del proyecto se han reconocido la unidad lito estratigráfica Depósitos de pendiente cuya edad se encuentra comprendida en el Cuaternario. Esta unidad Lito estratigráfica cubre a toda la población de Yaroca, incluyendo el tramo de río proyectado a intervenir. Debido a ello, en el cauce del río Ricrán encontramos abundante cantidad de piedras medianas y pequeñas, arena y muy poca cantidad de material fino.

La corriente fluvial ocasiona la erosión horizontal y lateral del cauce del río Ricrán, con ocurrencia de derrumbes y arrastre de fragmentos de material consolidado en los bordes, formando los depositos de tipo aluvial y ademas el aporte de solidos es transportado en suspension, saltacion y rodamiento, que conjuntamente con la fuerza hidraulica actuan como componentes de la fuerza erosiva de la corriente. La componente horizontal origina una erosión lateral por socavamiento, dando lugar a derrumbes de las margenes y los componentes verticales originan una erosión de fondo de río, con un arrastre de materiales hacia aguas abajo. Los que van depositandose por perdida de capacidad de transporte del río, dando lugar a la acumulacion de sedimentos.

Gravoso	X	Arenas	X	Limo	-	Arcillas	-
---------	---	--------	---	------	---	----------	---

Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrología

El río Ricrán tiene su origen en las alturas del distrito de Ricrán, provincia de Jauja, departamento de Junín a 3675 msnm desemboca en el Océano Atlántico. Es alimentado por varios afluentes como las 7 lagunas del distrito de Ricrán la laguna Islacocha, Tauricocha, Torohuajana, Chiquito Torohuajana, Tipicocha, Pablococha (la más grande) y la "Cuchimachay", siendo la principales fuentes de abastecimiento de agua superficial del la zona. La longitud de máximo recorrido del cauce principal es de 160 kilómetros, presentando una pendiente promedio de 9.48%.


El Río Ricrán es de régimen irregular y torrencioso, el régimen hídrico de la cuenca del río Ricrán se divide en dos Periodos:

- Periodo de avenidas, con una duración de seis meses (diciembre – Mayo).

- Periodo de estiaje, que tiene una duración de seis meses (Junio – Noviembre).

El tramo crítico identificado se encuentra en la subcuenca baja que está conformada por el río principal de la Cuenca Ricrán desde las 7 lagunas hasta su desembocadura en el Océano Pacifico. Con escasa precipitación pluvial, el caudal de la cuenca para los periodos de retorno de 10, 50 y 100 años son 146.23, 276.76 y 339.44 m3/s respectivamente. La pendiente del cauce en el tramo que va desde la bocatoma hasta el puente vehicular de Yaroca es 2.88%.

DISTRIBUCION DE GUMBEL TIPO I



2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

N° de Habitantes	N° de Viviendas	Tipo	N° de I.E. P.I.E.S.	Nombre	Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
40	10	Material rustico	1	I.E.I. N° 30829	1	Centro de Salud de Yaroca	1	Estadio comun
							1	Carretera principal
							1	Puente principal de acceso

En la zona intervenida del río Ricran, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	N°	infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
3.00	Maíz	1	-	Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
		-		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Hortalizas	2		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Otros	-		Equinos	-	Carreteras	-	1	30
	-	-		Porcinos	-	Redes Electricas	Local	-	-
	-	-		otros	-	Servicios de agua y desagüe	Red principal	-	-

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
MURO DE GAVIONES	km	2.14	Una longitud total de 2,140 m, de conformación de muro de gaviones; siendo en la margen izquierda 1,070 m, y en la margen derecha 1,070 m, del RIO RICRÁN.	

3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1.07	1,070 m, de limpieza y descolmatación en el cauce del RIO RICRÁN.	
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	km	2.14	Una longitud total de 2,140 m, de conformación de dique con material propio, siendo en la margen izquierda 1,070 m, y en la margen derecha 1,070 m, del RIO RICRÁN.	

3.2.1 Acciones Complementarias


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

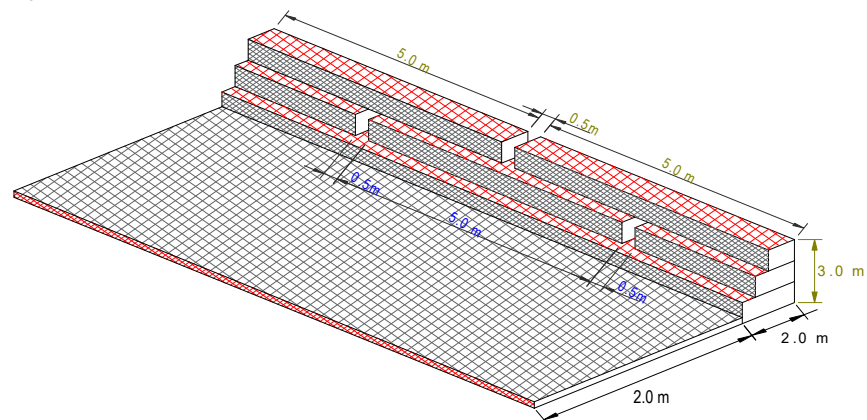

4.2.-VISTA DE PERFIL

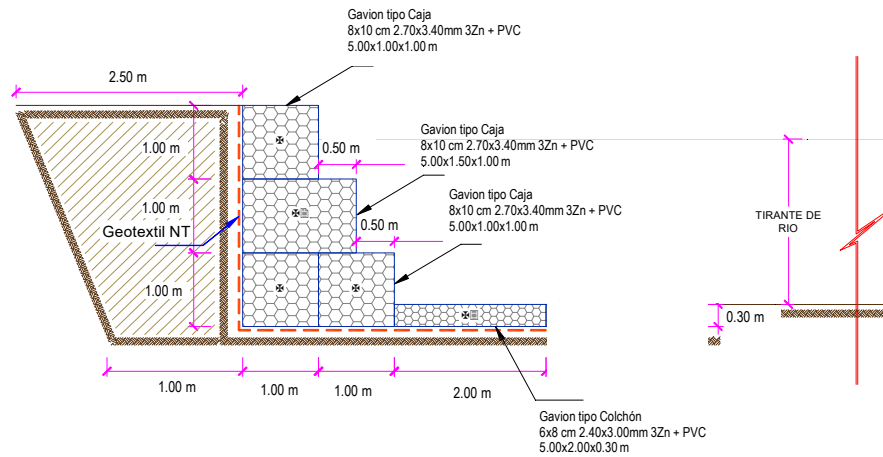

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N°01: TRAMO CRÍTICO EN EL RÍO RICRÁN, EN EL SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN.



FIGURA N°02: INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°30829 Y VIVIENDAS AFECTADAS EN PERIODOS DE AVENIDAS



FIGURA N°03: PUENTE VEHICULAR DE ACCESO SOCAVADO POR EL RIO, PUENTE CON MAS DE 40 AÑOS DESDE SU CONSTRUCCIÓN.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,070.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2,140.00 ML.)					
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,184.54
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				37,797.35
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00	10,021.59	20,043.18
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	0.20	7,721.90	1,544.38
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	180.00	6.03	1,085.40
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.21	1,881.02	6,038.07
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	3.21	2,830.63	9,086.32
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				215,149.93
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE	m3	8,988.00	7.33	65,882.04
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	11,235.00	7.65	85,947.75
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	2,568.00	12.79	32,844.72
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6,420.00	3.95	25,359.00
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	353.10	14.49	5,116.42
01.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE				3,999,681.40
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	17,762.00	14.99	266,252.38
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	10,914.00	86.01	938,713.14
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	10,914.00	34.25	373,904.50
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	789.16	337,760.48
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	1,284.00	655.72	841,944.48
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	428.00	864.65	370,070.20
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	26.45	11,320.60
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	1,284.00	35.27	45,286.68
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	428.00	44.08	18,866.24
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	1,284.00	38.05	48,856.20
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	6,420.00	51.71	331,978.20
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	3,210.00	60.88	195,424.80
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	4,280.00	13.23	56,624.40
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	6,420.00	16.54	106,186.80
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	3,210.00	17.63	56,592.30
1.05	FORESTACION				27,905.67
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	1,426.67	8.68	12,383.50
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	1,426.67	3.09	4,408.41
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und.	1,426.67	7.79	11,113.76
1.06	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
	COSTO DIRECTO				4,298,718.89
	GASTOS GENERALES (10%CD)				429,871.89
	UTILIDAD (10%CD)				429,871.89
	SUB TOTAL				5,158,462.67
	IGT (18%)				928,523.28
	TOTAL				6,086,985.95
	SUPERVISCION (5%CD)				214,935.94
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)				85,674.38
	FICHA DEFINITIVA				20,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL				6,407,896.27

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 27/100 SOLES



8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,070.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2,140.00 ML.)																			
01.01 I OBRAS PROVISIONALES																			
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
01.01.02	CASITA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES																			
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	V/E	2.00																
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00																
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00																
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	17.00																
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE	m3	11.00																
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	14.00																
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	4.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00																
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00																
01.04 PROTECCION CIGAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE																			
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	36.00																
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA 8" @ 8"	m3	37.00																
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	24.00																
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und	9.00																
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und	11.00																
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und	9.00																
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und	9.00																
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	Und	9.00																
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	Und	9.00																
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m3	11.00																
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m3	11.00																
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m3	11.00																
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m2	11.00																
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m2	11.00																
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m2	11.00																
1.05 FORESTACION																			
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und	2.00																
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Und	6.00																
01.05.03	REGIO Y MANTENIMIENTO	Und	5.00																
1.06 PLETE TERRESTRE																			
01.06.01	PECTE TERRESTRE	GLB	1.00																

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISION																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								

Fecha de elaboracion de la ficha: 10/29/2025

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Lugar: SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Fecha: 10/29/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,070.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2,140.00 ML.)					
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,184.54
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				37,797.35
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00	10,021.59	20,043.18
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	0.20	7,721.90	1,544.38
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	180.00	6.03	1,085.40
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.21	1,881.02	6,038.07
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	3.21	2,830.63	9,086.32
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				215,149.93
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	8,988.00	7.33	65,882.04
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	11,235.00	7.65	85,947.75
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	2,568.00	12.79	32,844.72
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6,420.00	3.95	25,359.00
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	353.10	14.49	5,116.42
01.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE				3,999,681.40
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	17,762.00	14.99	266,252.38
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	10,914.00	86.01	938,713.14
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	10,914.00	34.25	373,804.50
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	789.16	337,760.48
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	1,284.00	655.72	841,944.48
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	428.00	864.65	370,070.20
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	26.45	11,320.60
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	Und.	1,284.00	35.27	45,286.68
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	Und.	428.00	44.08	18,866.24
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m3	1,284.00	38.05	48,856.20
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m3	6,420.00	51.71	331,978.20
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m3	3,210.00	60.88	195,424.80
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m2	4,280.00	13.23	56,624.40
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m2	6,420.00	16.54	106,186.80
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m2	3,210.00	17.63	56,592.30
1.05	FORESTACIÓN				27,905.67
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	1,426.67	8.68	12,383.50
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	1,426.67	3.09	4,408.41
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und.	1,426.67	7.79	11,113.76
1.06	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					4,298,718.89
GASTOS GENERALES (10%CD)					429,871.89
UTILIDAD (10%CD)					429,871.89
SUB TOTAL					5,158,462.67
IGV (18%)					928,523.28
TOTAL					6,086,985.95
SUPERVISIÓN (5%CD)					214,935.94
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)					85,974.38
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					6,407,896.27

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 27/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA


PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIALES DE LA PROPUESTA TECNICA

Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MARGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Ubicación: SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Fecha: 10/29/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,070.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2,140.00 ML.)								
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	CAJETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2						15.00
	cajeta de guardiania y/o almacen		1.00	5.00	3.00		15.00	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	vje						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km						0.20
			1.00	0.20			0.20	
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3						180.00
			1.00	20.00	3.00	3.00	180.00	
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km						3.21
	Limpieza y Descolmatacion		1.00	1.07			3.21	
	Gaviones		1.00	2.14				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km						3.21
	Limpieza y Descolmatacion		1.00	1.07			3.21	
	Gaviones		1.00	2.14				
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CAUCE	m3						8,988.00
	Cauce estable de río		1.00	1,070.00	14.00	0.60	8,988.00	
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3						11,235.00
	conformación de dique con material propio		1.00	2,140.00	1.75	3.00	11,235.00	
01.03.03	EXCAVACION DE BASE ANTISCOCAVANTE	m3						2,568.00
	Gaviones caja y Colchon antisocavante		1.00	2,140.00	4.00	0.30	2,568.00	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						6,420.00
	perfilado y refine en talud de dique		1.00	2,140.00		3.00	6,420.00	
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						353.10
	eliminación de material excedente		1.00	esp = 10%			353.10	
1.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISCOCAVANTE							
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2						17,762.00
	suministro, transporte e instalacion de geotextil no tejido		1.00	2,140.00	8.30		17,762.00	
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3						10,914.00
	Gavion tipo colchon 5.0 x 2.0 x 0.30 m		1	2,140.00	2.00	0.30	1,284.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.0 x 1.0 m		3	2,140.00	1.00	1.00	6,420.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.5 x 1.0 m		1	2,140.00	1.50	1.00	3,210.00	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3						10,914.00
	Carguio y transporte de piedra			10,914.00			10,914.00	
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						428.00
	Suministro y armado gavion tipo colchon		1	2,140.00			428.00	
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	und.						1,284.00
	Suministro y armado gavion tipo caja		3	2,140.00			1,284.00	
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	und.						428.00
	Suministro y armado gavion tipo caja		1	2,140.00			428.00	
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						428.00
	Instalación gavion tipo colchon		1	2,140.00			428.00	
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	und.						1,284.00
	Instalación gavion tipo caja		3	2,140.00			1,284.00	
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	und.						428.00
	Instalación gavion tipo caja		1	2,140.00			428.00	
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3						1,284.00
	Llenado gavion tipo colchon		1	2,140.00	2.00	0.30	1,284.00	
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3						6,420.00
	Llenado gavion tipo caja		3	2,140.00	1.00	1.00	6,420.00	
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3						3,210.00
	Llenado gavion tipo caja		1	2,140.00	1.50	1.00	3,210.00	
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2						4,280.00
	Tapado gavion tipo colchon		1	2,140.00	2.00		4,280.00	
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2						6,420.00
	Tapado gavion tipo caja		3	2,140.00	1.00		6,420.00	
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2						3,210.00
	Tapado gavion tipo caja		1	2,140.00	1.50		3,210.00	
01.05.	FORESTACION							
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	und.						1,426.67
	Habilitación y suministro de plantones		4	2,140.00			1,426.67	
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	und.						1,426.67
	Excavación de hoyos y plantación		4	2,140.00			1,426.67	
01.05.02	RIEGO Y MANTENIMIENTO	und.						1,426.67
	Riego y mantenimiento		4	2,140.00			1,426.67	
1.06.	PLETE TERRESTRE							
1.06.01.	PLETE TERRESTRE	nh	1	1.00			1.00	1.00



NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL.

Análisis de precios unitarios Referenciales de la Propuesta Técnica

Presupuesto	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.						
Lugar	SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.						
Fecha	10/29/2025						
Partida	01.01		CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : und		1,778.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	8.0000	28.46	227.68
0101010005	PEON		hh	2.0000	16.0000	20.29	324.64
							552.32
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"		kg		2.0000	7.25	14.50
0207030001	HORMIGON		m3		0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		1.2000	30.00	36.00
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		70.0000	7.00	490.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	650.00	650.00
							1,209.70
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	552.32	16.57
							16.57
Partida	01.02		CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		93.73
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12
							28.46
	Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2500	7.25	1.81
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm		m2		0.8000	9.60	7.68
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		6.0000	7.00	42.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm		m2		0.7500	17.24	12.93
							64.42
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	28.46	0.85
							0.85
Partida	02.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : glb		10,021.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	6.0000	48.0000	20.29	973.92
							973.92
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	973.92	29.22
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn		hm	0.7500	6.0000	452.00	2,712.00
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN		hm	1.8750	15.0000	420.43	6,306.45
							9,047.67
Partida	02.02		HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000		Costo unitario directo por : km		7,721.90
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	10.0000	22.40	224.00
0101010005	PEON		hh	1.0000	10.0000	20.29	202.90
							426.90
	Equipos						
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	10.0000	729.50	7,295.00
							7,295.00
Partida	02.03		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000		Costo unitario directo por : m3		6.03
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0080	20.29	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	0.1000	0.0008	22.40	0.02
							0.18
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0080	729.50	5.84
							5.85

Partida	2.04		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000		Costo unitario directo por : km		1,881.02
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	1.6000	28.46	45.54
0101010005	PEON		hh	0.5000	8.0000	20.29	162.32
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	16.0000	29.42	470.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.5000	8.0000	22.40	179.20
							857.78
	Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"		var		0.5000	22.30	11.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		3.6000	30.00	108.00
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.3500	60.17	21.06
							432.71
	Equipos						
0301000014	MIRAS		día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES		día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	16.0000	23.48	375.68
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	857.78	25.73
							590.53

Partida	2.05		CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000		Costo unitario directo por : km		2,830.63
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.40		89.60
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.29		405.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	29.42		1,176.80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.40		224.00
							1,896.20
	Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00		60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65		232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17		15.04
							307.54
	Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	14.25		570.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,896.20		56.89
							626.89
Partida	03.01		LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE				
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000		Costo unitario directo por : m3		7.33
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.46		0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.29		0.19
							0.46
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46		0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	729.50		6.86
							6.87
Partida	03.02		CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000		Costo unitario directo por : m3		7.65
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.29		0.20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.40		0.22
							0.42
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42		0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	729.50		7.22
							7.23
Partida	03.03		EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE				
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ. 800.0000		Costo unitario directo por : m3		12.79
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	0.0010	28.46		0.03
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	20.29		0.20
							0.23
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.23		0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1.0000	0.0100	525.13		5.25
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0100	729.50		7.30
							12.56

Partida	03.04		PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m2		3.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.40	0.15	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.29	0.27	
						0.42	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1.0000	0.0067	525.13	3.52	
						3.53	
Partida	03.05		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m3		14.49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.29	0.14	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.40	0.02	
						0.16	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.16		
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	1.0000	0.0067	399.70	2.68	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	436.20	11.65	
						14.33	
Partida	04.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT 20				
Rendimiento	m2/DIA	500.0000	EQ. 500.0000		Costo unitario directo por : m2		14.99
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.46	0.46	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.40	0.36	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.29	0.65	
						1.47	
	Materiales						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1.0500	12.84	13.48	
						13.48	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.47	0.04	
						0.04	
Partida	04.02		SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"				
Rendimiento	m3/DIA	100.0000	EQ. 100.0000		Costo unitario directo por : m3		86.01
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	22.40	1.79	
0101010005	PEON	hh	25.0000	2.0000	20.29	40.58	
						42.37	
	Materiales						
02070100050005	PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad)	m3		1.0000	42.37	42.37	
						42.37	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.37	1.27	
						1.27	



Partida	04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA					
Rendimiento	m3/DIA	460.0000	EQ. 460.0000	Costo unitario directo por : m3		34.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0174	22.40	0.39	
						0.39	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.39	0.02	
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	0.5000	0.0087	399.70	3.48	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0696	436.20	30.36	
						33.86	
Partida	04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m					
Rendimiento	und/DIA	16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : und		789.16	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.40	11.20	
0101010005	PEON	hh	2.0000	1.0000	20.29	20.29	
						31.49	
Materiales							
02043000010005	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.30 ' und			1.0000	756.73	756.73	
						756.73	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.49	0.94	
						0.94	
Partida	04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m					
Rendimiento	und/DIA	6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : und		655.72	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.3750	0.5000	22.40	11.20	
0101010005	PEON	hh	0.7500	1.0000	20.29	20.29	
						31.49	
Materiales							
02043000010006	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRI und			1.0000	623.29	623.29	
						623.29	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.49	0.94	
						0.94	
Partida	04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m					
Rendimiento	und/DIA	8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		864.65	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.40	11.20	
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	20.29	20.29	
						31.49	
Materiales							
02043000010007	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 T und			1.0000	832.22	832.22	
						832.22	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	31.49	0.94	
						0.94	

Partida	04.07		INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 x 2 x 0.30				
Rendimiento	und/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : und		26.45
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.8000	20.29	16.23
		Equipos					25.19
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.19		1.26
							1.26
Partida	04.08		INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 x 1 x 1m				
Rendimiento	und/DIA	15.0000	EQ. 15.0000		Costo unitario directo por : und		35.27
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	22.40	11.95
0101010005	PEON		hh	2.0000	1.0667	20.29	21.64
		Equipos					33.59
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	33.59		1.68
							1.68
Partida	04.09		INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 x 1.5 x 1m				
Rendimiento	und/DIA	12.0000	EQ. 12.0000		Costo unitario directo por : und		44.08
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	22.40	14.93
0101010005	PEON		hh	2.0000	1.3333	20.29	27.05
		Equipos					41.98
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	41.98		2.10
							2.10
Partida	04.10		LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m				
Rendimiento	m3/DIA	40.0000	EQ. 40.0000		Costo unitario directo por : m3		38.05
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.2000	22.40	4.48
0101010005	PEON		hh	8.0000	1.6000	20.29	32.46
		Equipos					36.94
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	36.94		1.11
							1.11



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Partida	04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m					
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3		51.71	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	22.40	5.97	
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.1333	20.29	43.28	
						49.25	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	49.25	2.46	
						2.46	
Partida	04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m					
Rendimiento	m3/DIA	25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m3		60.88	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.40	7.17	
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.29	51.94	
						59.11	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	59.11	1.77	
						1.77	
Partida	04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON 5 X 2.00 X 0.30 m					
Rendimiento	m2/DIA	40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2		13.23	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	22.40	4.48	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.4000	20.29	8.12	
						12.60	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	12.60	0.63	
						0.63	
Partida	04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m					
Rendimiento	m2/DIA	32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por : m2		16.54	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2500	22.40	5.60	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.5000	20.29	10.15	
						15.75	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	15.75	0.79	
						0.79	

Partida	04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m					
Rendimiento	m2/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2		17.63	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	22.40	5.97	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.5333	20.29	10.82	
						16.79	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	16.79	0.84	
						0.84	
Partida	05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES					
Rendimiento	und/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : und		8.68	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0008	22.40	0.02	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.29	0.16	
						0.18	
	Materiales						
0291010006	PLANTON NATIVO	und		1.0000	5.00	5.00	
						5.00	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	1.0000	0.0080	436.20	3.49	
						3.50	
Partida	05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION					
Rendimiento	und/DIA	60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : und		3.09	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0133	22.40	0.30	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.29	2.70	
						3.00	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.00	0.09	
						0.09	
Partida	05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO					
Rendimiento	und/DIA	300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : und		7.79	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	0.0027	22.40	0.06	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0267	20.29	0.54	
						0.60	
	Equipos						
03012200050005	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 G/hm		1.0000	0.0267	269.45	7.19	
						7.19	

Partida	06.01	FLETE TERRESTRE					
Rendimiento	gib/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : gib		15,000.00	
Código	Descripción Recurso	Materiales	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0203020002	FLETE TERRESTRE		gib		1.0000	15,000.00	15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Lugar SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Fecha 10/29/2025

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	390.3835	28.46	11,110.31
0101010004	OFICIAL	hh	9,959.6634	22.40	223,096.46
0101010005	PEON	hh	58,180.9054	20.29	1,180,490.57
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	111.6177	22.40	2,500.24
0101030000	TOPOGRAFO	hh	179.7600	29.42	5,288.54
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	57.7800	22.40	1,294.27
					1,423,780.39
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	qib	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	1.6050	22.30	35.79
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3.7500	7.25	27.19
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	7.25	14.50
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	9.60	115.20
02043000010005	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.5 TRIPLE ZINC	und	428.0000	756.73	323,880.44
02043000010006	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRIPLE ZINC	und	1,284.0000	623.29	800,304.36
02043000010007	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE ZINC	und	428.0000	832.22	356,190.16
02070100050005	PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad)	m3	10,914.0000	42.37	462,426.18
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	18,650.1000	12.84	239,467.28
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	12.7560	30.00	382.68
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	19.2600	20.00	385.20
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	321.0022	4.65	1,492.66
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	1.9260	60.17	115.89
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0291010006	PLANTON NATIVO	und	1,426.6700	5.00	7,133.35
					2,208,954.03
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	12.8400	17.36	222.90
0301000015	JALONES	día	25.6800	14.96	384.17
0301000022	ESTACION TOTAL	he	51.3600	23.48	1,205.93
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	128.4000	14.25	1,829.70
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			54,618.88
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	97.3176	399.70	38,897.84
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	68.6940	525.13	36,073.28
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	224.8337	729.50	164,016.18
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	452.00	5,424.00
03012200050005	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN	hm	38.0921	269.45	10,263.92
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	780.4556	436.20	340,434.73
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	420.43	12,612.90
					665,984.43
Total				S/.	4,298,718.85

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN AMBAS MARGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROGA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Ubicación: SECTOR YAROGA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE Tarma, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Fecha: 10/28/2023

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION (L= 1,070.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 2,140.00 ML.)																			
01.01 OBRAS PROVISIONALES																			
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	unld	1.00																
01.01.02	CASITA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES																			
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	VJE	2.00																
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00																
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	7.00																
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	17.00																
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE	m3	11.00																
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	14.00																
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISCAVANTE	m3	4.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINO EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00																
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00																
01.04 PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISCAVANTE																			
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	36.00																
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 8"	m3	37.00																
01.04.03	CARGUO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	24.00																
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Unld	9.00																
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Unld	11.00																
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Unld	9.00																
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Unld	9.00																
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	Unld	9.00																
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	Unld	9.00																
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m3	11.00																
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m3	11.00																
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m3	11.00																
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m2	11.00																
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m2	11.00																
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m2	11.00																
1.05 FORESTACION																			
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Unld	2.00																
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION	Unld	6.00																
01.05.03	REGO Y MANTENIMIENTO	Unld	5.00																
1.06 PLETE TERRESTRE																			
01.06.01	LETE TERRESTRE	GLB	1.00																



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVION, EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO RICRÁN, SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Lugar SECTOR YAROCA, DISTRITO DE TAPO, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Fecha 10/29/2025

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISIÓN																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 5.30 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton		42.4
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	1	10.6
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	2	21.2
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd ³	1	10.6
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton		3.0
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m ³	7	74.2
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	10.6
