

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

FTR-CB-PREV N° 0470-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHH

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACIÓN:

AAA **CAÑETE - FORTALEZA** ALA **CHANCAY HUARAL** Fecha **24/07/2026**

1.1. Ubicación política

Departamento **LIMA** Provincia **HUARAL** Distrito **HUARAL** Sector **LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO**

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica **CUENCA CHANCAY - HUARAL** Cuerpo de agua **RIO CHANCAY-HUARAL**

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO	258,619	8,718,379	18L	256,459	8,716,270	18L	EJE DE CACUE	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION
TRAMO 1	258,576	8,718,392	18L	256,413	8,716,356	18L	DERECHA	DIQUE ENROCADO 2,980 ml

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ X flujo de detritos ☒ X erosion fluvial ☐

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☐ Muy Alto ☒ X


2.3. Geología

El área de la cuenca ha sido delimitada en las siguientes unidades geomorfológicas claramente definidas:
 La información de suelos obtenida del estudio realizado por la ONERN en 1969 nos brinda una idea generalizada de los suelos en toda la cuenca y está representada mediante 07 unidades cartográficas amplias denominadas Asociaciones de Suelos y como unidades taxonómicas de abstracción.
 Afloramientos rocosos: Ubicados en ambos flancos del valle y formando elevaciones del tipo "cerros testigos". En el valle bajo existen grandes sectores de esta unidad con cobertura de mantos de arena de origen eólico. Estos afloramientos están constituidos por rocas ígneas intrusivas del batolito costanero.
 Depósitos aluviales (Q-al): Unidad geomorfológica extensa en la cuenca Chancay-Huaral. Son terrenos llanos ubicados en ambas márgenes del río Chancay, las cuales pertenecen a la planicie del cono deyectivo. Es el propio río el que arrastra y deposita sedimentos constituidos por arcillas, arenas, gravas, guijarros, bloques, cantos (de diverso tamaño y litología). Este proceso abrasivo de los sedimentos es traducido en un redondeamiento más o menos intenso de sus elementos. De este modo los sedimentos quedan clasificados o distribuidos en capas, y priman en ellos determinados rangos de tamaño, los cuales están en función de la intensidad de la corriente que los transportó y los depositó luego.
 Litológicamente está constituido por clastos angulosos con sedimentos arcillosos, así como por limos y arenas muy finas provenientes del litoral que fueron transportados por acción eólica. Esta unidad posee aceptable permeabilidad y porosidad.
 Adicionalmente se presentan las áreas con cultivo a nivel de cuenca de manera muy general en base a la información que se aprecian en la carta Nacional digitalizada bajo la cobertura vegetación, esta área representa el 0.2% del área total de la cuenca.

Gravoso	60	Arenas	25	Limo	15	Arcillas	-
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)							

2.4. Hidrología

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Chancay-Huaral, no es ajena a estos fenómenos, a continuación, se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río. En la Cuenca Chancay-Huaral se ha presentado el Fenómeno El Niño (FEN), ocurrido según los registros históricos el año 1967 con caudal máximo instantáneo en el río Chancay-Huaral de 400.604 m³/seg, el año 1972 con 484.193 m³/seg y el año 1981 con caudal de 142.533 m³/seg. La obtención de los caudales de diseño, se ha llevado a cabo a través del análisis estadístico del registro de caudales máximos instantáneos en la Estación de aforo Santo Domingo cuya operación está a cargo del SENAMHI. El análisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadístico, a través de la distribución de los datos, que permite reproducir los valores observados en la estación de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de diseño para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencias; Cabe precisar que el caudal máximo para el año 2017 registrado en la estación Santo Domingo fue de 180 m³/s por encima del umbral del río Chancay-Huaral que es de 120 m³/s. fenómeno del ciclón Yaku se tiene un umbral de 146.53 m³/s. Además en esta quebrada durante los meses de enero a marzo por el transporte de sedimentos los pobladores aprovechan para trasladar arena gruesa y hormigon, generando acumulacion de material en el cauce que origina desborde por la carretera, de acuerdo a las huellas maxima se genera un caudal de 30 - 50m³/seg.

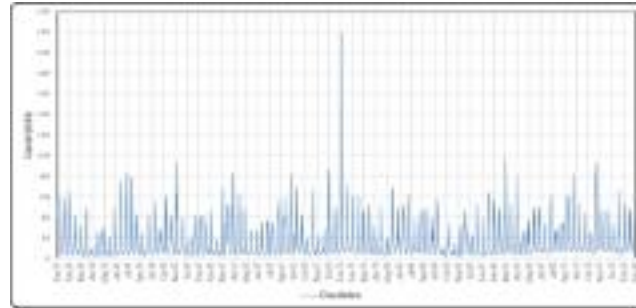

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de I.E.P.I.E.S.	Nombre	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
68		ladrillo, bloque de cemento	-	-	-	-	-	-
		Piedra, sillar con cal ó cemento						
	17	Adobe ó tapia						
		Quincha (caña con barro)						
		Piedra con barro						
		Madera (Pona, Tornillo, etc)						
		Otro material						

En la zona intervenida del río Chancay-Huaral, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
49.50	Maíz	17		Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
	Papa	9		Ovinos	-	Canales	-	-	-
	Camote	3		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	Aji	6		Equinos	-	Vías	-	1	1,200
	Tomate	2		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	Uva	4		otros	-	Servicios de agua y desagüe	-	-	-
	Maracuya	1.5							
	Yuca	7							

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	Km	2.98	se conformara diques semicompactados con material propio en la margen Derecha del río Chancay-Huaral, con equipos mecanicos en una longitud de 2,980.00 m, que tendra una seccion transversal de 4.50 metros de alto y 4.00 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5	
ENROCADO ACOMODADO	Km	2.98	Se propone, implementar estructuras de proteccion en la margen Derecha del río Chancay-Huaral en una longitud total de 2,980.00 m conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud interior en un area de 28041.8 m2	Cantera de roca en pasamayo a 3.0 km

3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	3.03	Limpeza y descolmatación del cauce del río Chancay-Huairal en un tramo de longitud de 3,030.00 m en un ancho de cauce de 80.00 m y una altura de corte de 0.60 m	

3.2.1 Acciones Complementarias


Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos de origen hidrogeológico.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


4.1.- VISTA DE PLANTA

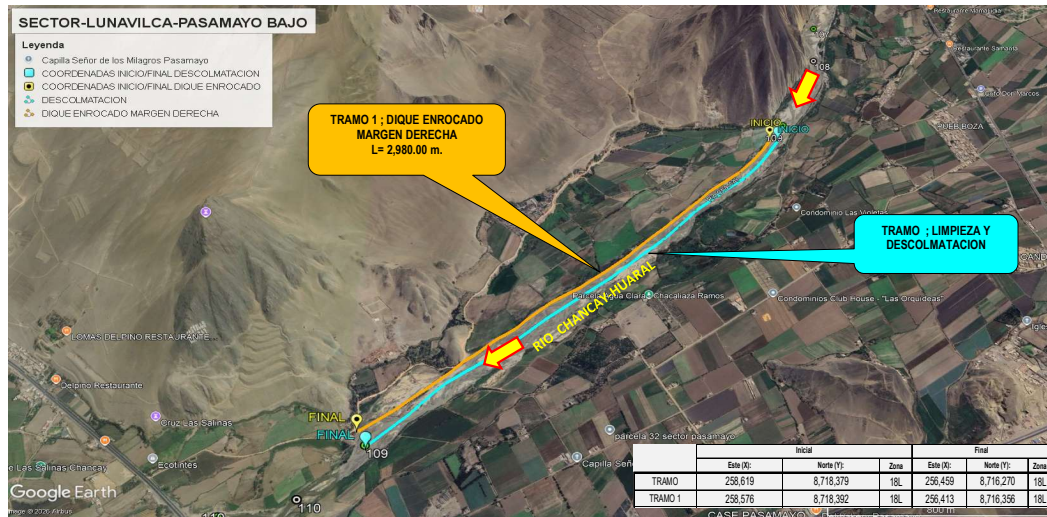

4.2.-VISTA DE PERFIL

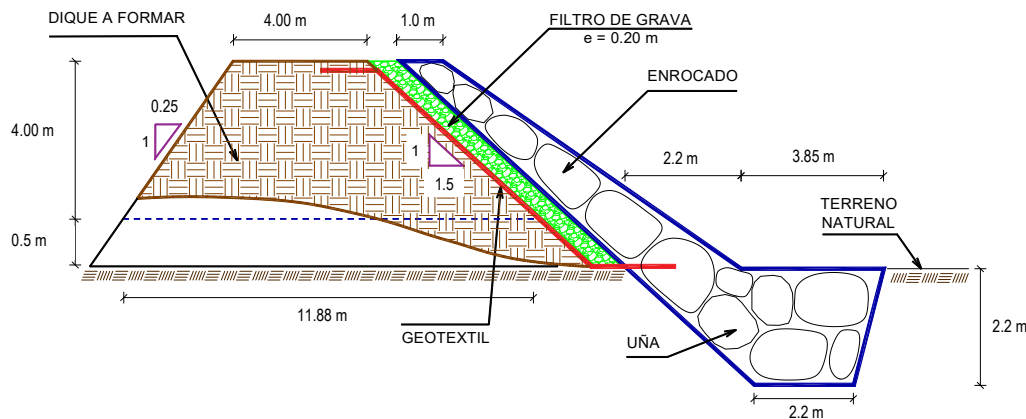

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

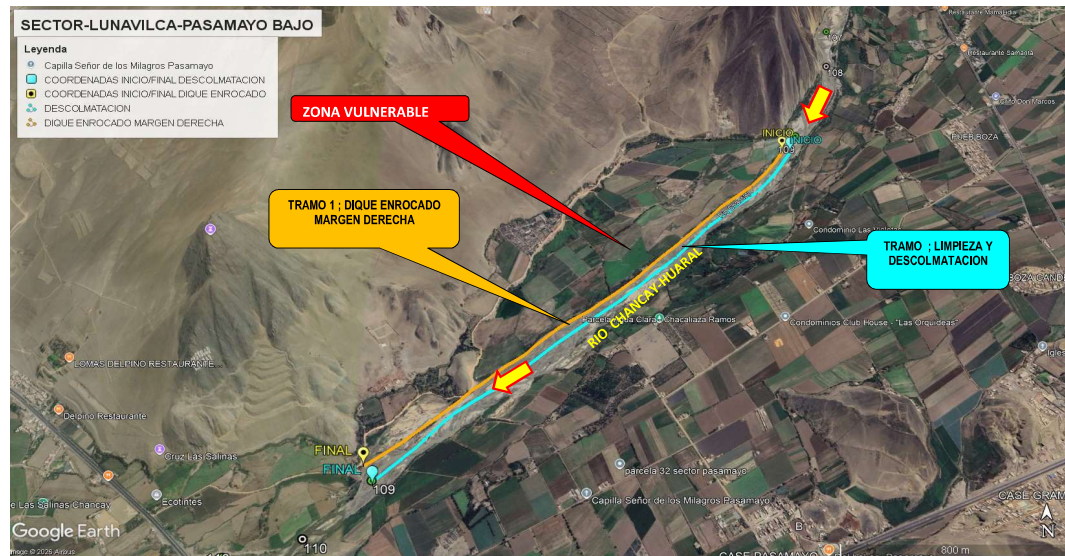

6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N°01: RIO CHANCAY-HUARAL, AGUAS ABAJO DE LA BOCATOMA PASAMAYO BAJO SIN DIQUE Y EROSIONADOS EN LA MARGEN DERECHA, QUE REQUIERE DE DESCOLMATACION Y CONFORMACION Y PROTECCION CON ENROCADO



FIGURA N°02: RIO CHANCAY-HUARAL, AGUAS ABAJO SE OBSERVA QUE REQUIERE DE INTERVENCION EN EL TRAMO PARA PROTEGER AREAS DE CULTIVO CERCANOS A LA MARGEN DERECHA.



FIGURA N°03: RÍO CHANCAY -HUARAL SE MUESTRA LA COLMATACION EN EL ANCHO DEL CAUCE

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L = 2980.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				40,379.84
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Glb	1.00	8,103.45	8,103.45
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.10	8,009.80	800.98
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00	6.25	1,500.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	6.01	1,904.02	11,443.16
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	6.01	2,908.61	17,480.75
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	50.00	21.03	1,051.50
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,174,514.00
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	145,440.00	7.59	1,103,889.60
3.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	106,441.88	7.93	844,084.11
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	27,043.50	10.59	286,390.67
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	24,175.22	3.22	77,844.21
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	72,645.78	11.87	862,305.41
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO				7,662,785.87
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	28,041.80	15.23	427,076.61
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2,682.00	125.82	337,449.24
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	48,499.50	40.55	1,966,654.73
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	48,499.50	15.45	749,317.28
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	48,499.50	71.09	3,447,829.46
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	21,634.80	18.35	396,998.58
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	17,164.80	19.66	337,459.97
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					10,895,895.15
GASTOS GENERALES (10%CD)					1,089,589.52
UTILIDAD (10%CD)					1,089,589.52
SUB TOTAL					13,075,074.18
IGV (18%)					2,353,513.35
TOTAL					15,428,587.53
SUPERVISIÓN (3%CD)					326,876.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					108,958.95
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					15,884,423.34

SON : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRCIENTOS VEINTITRES CON 34/100 SOLES

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	DIAS	PLAZO DE EJECUCIÓN																				
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCAD, (L = 2980.00 m)																								
1.00	OBRAS PROVISIONALES																							
1.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	1.00																					
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																					
2.00	TRABAJO PRELIMINARES																							
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Glb	1.00																					
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO	km	1.00																					
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																					
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	1.00																					
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	146.00																					
2.06	DESVOO DEL RIO	m	1.00																					
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	57.00																					
3.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	43.00																					
3.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCAD	m3	26.00																					
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	7.00																					
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	21.00																					
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCAD																							
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	54.00																					
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	4.00																					
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	80.00																					
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	49.00																					
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	61.00																					
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCAD	m3	72.00																					
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCAD	m3	61.00																					
5.00	FLETE TERRESTRE																							
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00																					

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACIÓN DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACIÓN																								
01.03	EJECUCIÓN																								
01.04	SUPERVISIÓN																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACIÓN																								

Fecha de elaboración de la ficha: 24/07/2026

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 24/07/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L = 2980.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				40,379.84
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Glb	1.00	8,103.45	8,103.45
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.10	8,009.80	800.98
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00	6.25	1,500.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	6.01	1,904.02	11,443.16
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	6.01	2,908.61	17,480.75
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	50.00	21.03	1,051.50
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,174,514.00
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	145,440.00	7.59	1,103,889.60
3.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	106,441.88	7.93	844,084.11
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	27,043.50	10.59	286,390.67
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	24,175.22	3.22	77,844.21
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	72,645.78	11.87	862,305.41
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO				7,662,785.87
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	28,041.80	15.23	427,076.61
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2,682.00	125.82	337,449.24
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	48,499.50	40.55	1,966,654.73
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	48,499.50	15.45	749,317.28
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	48,499.50	71.09	3,447,829.46
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	21,634.80	18.35	396,998.58
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	17,164.80	19.66	337,459.97
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					10,895,895.15
GASTOS GENERALES (10%CD)					1,089,589.52
UTILIDAD (10%CD)					1,089,589.52
SUB TOTAL					13,075,074.18
IGV (18%)					2,353,513.35
TOTAL					15,428,587.53
SUPERVISIÓN (3%CD)					326,876.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					108,958.95
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					15,884,423.34

SON : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRCIENTOS VEINTITRES CON 34/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA


Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicación: SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 24/07/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L = 2980.00 m)								
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
1.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	1.00	3.00	5.00		15.00	15.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4,80 m	Und.	1.00				1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Glb	1.00				1.00	1.00
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00	0.10			0.10	0.10
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		15.00	4.00	4.00	240.00	240.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00					6.01
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			3.03				
	DIQUE ENROCADO			2.98				
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.00					6.01
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			3.03				
	DIQUE ENROCADO			2.98				
2.06	DESÍVIO DEL RÍO	M	1.00	50.00			50.00	50.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	3,030.00	80.00	0.60	145,440.00	145,440.00
3.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	2,980.00	7.94	4.50	106,441.88	106,441.88
					area			
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1.00	2,980.00	9.08		27,043.50	27,043.50
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1.00	2,980.00		8.11	24,175.22	24,175.22
						esponj		
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	66,041.62		1.10	72,645.78	72,645.78
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO							
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.00	2,980.00	9.41		28,041.80	28,041.80
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00	2,980.00	0.90		2,682.00	2,682.00
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3			area			48,499.50
	Extracción de rocas para talud		1.00	2,980.00	7.20		21,456.00	
	Extracción de rocas para uña		1.00	2,980.00	9.08		27,043.50	
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						48,499.50
	Selección y acopio de rocas para talud		1.00	2,980.00	7.20		21,456.00	
	Selección y acopio de rocas para uña		1.00	2,980.00	9.08		27,043.50	
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						48,499.50
	Carguío y transporte de rocas para talud		1.00	2,980.00	7.20		21,456.00	
	Carguío y transporte de rocas para uña		1.00	2,980.00	9.08		27,043.50	
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						21,634.80
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1.00	2,980.00	9.08		21,634.80	
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						17,164.80
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1.00	2,980.00	7.20		17,164.80	
5.00	FLETE TERRESTRE							
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00				1.00	1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

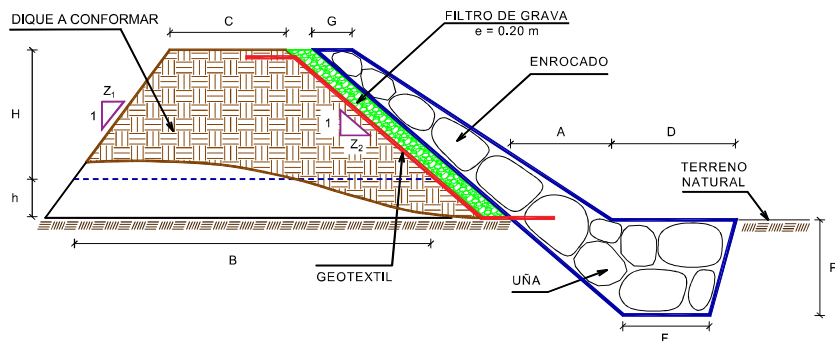

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA

Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha: 24/07/2026

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		95.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,4000	28,94	11,58
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,4000	22,68	9,07
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,4000	20,54	8,22
						28,87
Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			0,2500	6,59	1,65
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0,14 mm	m2		0,8000	11,60	9,28
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6,0000	7,00	42,00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0,7500	17,24	12,93
						65,86
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	28,87	0,87
						0,87
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1,781.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	8,0000	28,94	231,52
0101010005	PEON	hh	2,0000	16,0000	20,54	328,64
						560,16
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			2,0000	6,71	13,42
0207030001	HORMIGON	m3		0,4800	40,00	19,20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg)	bol		1,2000	26,55	31,86
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70,0000	7,00	490,00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1,0000	650,00	650,00
						1,204,48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	560,16	16,80
						16,80
Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		8,103.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	6,0000	48,0000	20,54	985,92
						985,92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	985,92	29,58
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19	hm	0,7500	6,0000	326,80	1,960,80
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x 4 330 HP 35	hm	1,8750	15,0000	341,81	5,127,15
						7,117,53



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Partida	02.02 HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO					
Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000	Costo unitario directo por : km		8,009.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	10.0000	22.68	226.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	20.54	205.40
						432.20
Equipos						
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	10.0000	757.76	7,577.60
						7,577.60

Partida	02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD					
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.54	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.68	0.02
						0.18
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	757.76	6.06
						6.07

Partida	02.04 TRAZO Y REPLANTEO					
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km		1,904.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.94	46.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.54	164.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	30.08	481.28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.68	181.44
						873.34
Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	27.47	13.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.8000	26.55	95.58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06
						422.88
Equipos						
0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	24.53	392.48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	873.34	26.20
						607.80

Partida	02.05 CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km		2,908.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.68	90.72
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.54	410.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	30.08	1,203.20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.68	226.80
						1,931.52



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17	15.04
307.54						
Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	15.29	611.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,931.52	57.95
669.55						
Partida	02.06	DESVIO DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m		21.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.94	0.72
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.68	0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.54	1.03
2.03						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	757.76	18.94
19.00						
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3		7.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.94	0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.54	0.19
0.46						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	757.76	7.12
7.13						
Partida	03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000	Costo unitario directo por : m3		7.93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.54	0.20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.68	0.22
0.42						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	757.76	7.50
7.51						
Partida	03.03	EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m3		10.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	22.68	0.52
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	20.54	0.47
0.99						





Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.99	0.05
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm		1.0000	0.0229	417.13	9.55
						9.60

Partida **03.04** **PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE**

Rendimiento	m2/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m2		3.22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.54	0.27
						0.42
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm		1.0000	0.0067	417.13	2.79
						2.80

Partida **03.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km**

Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m3		11.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.68	0.02
						0.16
Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm		1.0000	0.0067	320.60	2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	358.17	9.56
						11.71

Partida **04.01** **GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)**

Rendimiento	m2/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2		15.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	28.94	0.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	22.68	0.45
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	20.54	1.64
						2.67
Materiales						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1.0500	11.89	12.48
						12.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.67	0.08
						0.08

Partida **04.02** **SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA**

Rendimiento	m3/DIA	250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m3		125.82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	62.5000	2.0000	20.54	41.08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	3.1250	0.1000	22.68	2.27
						43.35
Materiales						
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3		1.1000	70.00	77.00
						77.00



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.35	1.30
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm		0.3125	0.0100	417.13	4.17
						5.47

Partida **04.03** **EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS**

Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3		40.55
-------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	--	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010007	PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	30.95	2.48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	29.30	2.34
0102010000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1.0000	0.0400	31.99	1.28
						7.01

Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.2500	7.31	1.83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE	m		1.0000	15.00	15.00
0255100010	FULMINANTE	und		1.0000	4.00	4.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und		0.0170	92.00	1.56
						22.39

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.01	0.35
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.0000	0.0800	6.22	0.50
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm		1.0000	0.0400	257.61	10.30
						11.15

Partida **04.04** **SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA**

Rendimiento	m3/DIA	250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m3		15.45
-------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	--	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	20.54	1.31
						2.04

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.04	0.06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25 hm		1.0000	0.0320	417.13	13.35
						13.41

Partida **04.05** **CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS**

Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3		71.09
-------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	--	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
						0.91

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.91	0.05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm		1.0000	0.0400	320.60	12.82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.1600	358.17	57.31
						70.18

Partida **04.06** **ACOMODO DE ROCAS EN UÑA**

Rendimiento	m3/DIA	300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m3		18.35
-------------	---------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	--	--------------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	20.54	2.19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0267	22.68	0.61
						2.80



Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.80	0.08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0267	579.26	15.47
						15.55
Partida	04.07	ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m3/DIA	280.0000	EQ. 280.0000	Costo unitario directo por : m3		19.66
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1143	20.54	2.35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0286	22.68	0.65
						3.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.00	0.09
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0286	579.26	16.57
						16.66
Partida	05.01	FLETE TERRESTRE				
Rendimiento	glb/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : glb		15,000.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
						15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad



Administrador de La
Administración Local Del Agua

Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente por
AQUINO
GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Firmado
digitalmente por
AQUINO GONZALES
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MÁRGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 24/07/2026

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	1,952.8383	28.94	56,515.14
0101010004	OFICIAL	hh	4,865.7358	22.68	110,354.89
0101010005	PEON	hh	19,073.8456	20.54	391,776.79
0101010007	PERFORISTA	hh	3,879.9600	30.95	120,084.76
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	4,381.5611	22.68	99,373.81
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	3,879.9600	29.30	113,682.83
0101030000	TOPOGRAFO	hh	336.5600	30.08	10,123.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	108.1800	22.68	2,453.52
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1,939.9800	31.99	62,059.96
					966,425.42
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	3.0050	27.47	82.55
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3.7500	6.59	24.71
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	11.60	139.20
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	2,950.2000	70.00	206,514.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	29,443.8900	11.89	350,087.85
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	22.8360	26.55	606.30
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	36.0600	20.00	721.20
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	601.0022	4.65	2,794.66
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	3.6061	60.17	216.98
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	12,124.8750	7.31	88,632.84
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	48,499.5000	15.00	727,492.50
0255100010	FULMINANTE	und	48,499.5000	4.00	193,998.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	824.4915	92.00	75,853.22
					1,664,160.58
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	dia	24.0400	17.36	417.33
0301000015	JALONES	dia	48.0800	14.96	719.28
0301000022	ESTACION TOTAL	he	96.1600	24.53	2,358.80
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	240.4000	15.29	3,675.72
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			34,001.73
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	3,879.9600	6.22	24,133.35
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	1,939.9800	257.61	499,758.25
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	2,426.7067	320.60	778,002.17
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1,068.5625	579.26	618,975.51
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	2,360.0742	417.13	984,457.75
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	2,425.0806	757.76	1,837,629.08
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	6.0000	326.80	1,960.80
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	9,699.5623	358.17	3,474,092.23
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	15.0000	341.81	5,127.15
					8,265,309.15
Total				S/.	10,895,895.15



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicación SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha 24/07/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	DIAS	PLAZO DE EJECUCIÓN																			
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 3,030.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE C/ENROCADO, (L = 2980.00 m)																							
1.00	OBRAS PROVISIONALES																						
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00																				
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																				
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES																						
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	Glb	1.00																				
2.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO	km	1.00																				
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																				
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	1.00																				
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	146.00																				
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	1.00																				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																						
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	57.00																				
3.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	43.00																				
3.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	28.00																				
3.04	PERFLADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	7.00																				
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	21.00																				
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO																						
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	54.00																				
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	4.00																				
4.03	EXTRACCION DE ROCAS	m3	60.00																				
4.04	SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS	m3	49.00																				
4.05	CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	61.00																				
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	72.00																				
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	61.00																				
5.00	FLETE TERRESTRE																						
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00																				



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHANCAY-HUARAL, SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

LUGAR SECTOR LUNAVILCA-PASAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FECHA 24/07/2026

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06				MES 07			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																												
01.02	CONTRATACION																												
01.03	EJECUCION																												
01.04	SUPERVISION																												
01.05	SEGUIMIENTO																												
01.06	LIQUIDACION																												



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
ROQUE AGUILAR Evelyn Malena
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 2.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	3	12.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3	3	12.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton		1.0
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	8	32.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	4.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	1	4.0
CAMIONETA 4X4 PICK-UP	1	4.0



Firmado digitalmente por
BEJARANO QUICHIZ Julio Cesar
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elab
la ficha técnica referencia



Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente por
AQUINO
GONZALES Cesar
Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Firmado
digitalmente por
AQUINO GONZALES
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
